

Actuacions al Turó de la Rovira 2017 - 2019

Districte d'Horta – Guinardó

25 de març de 2019





00

Inspeccions prèvies





Dates inspeccions: 9, 10 i 12 d'agost de 2017





01

Actuacions realitzades

Àmbit: C. Francesc Alegre

- 1. Retirada de fragments visibles de fibrociment**
- 2. Confinaments de camins i talussos**
- 3. Inspecció i recollida de restes de fibrociment**




1. Retirada de fragments visibles de fibrociment

Dates: 18, 19 i 20 d'octubre de 2017

Quantitat enretirada: 4 Tn de fragments de fibrociment

Tècnica: Recollida manual amb Pla de Treball aprovat per l'Autoritat Laboral

Import: 9.294 €

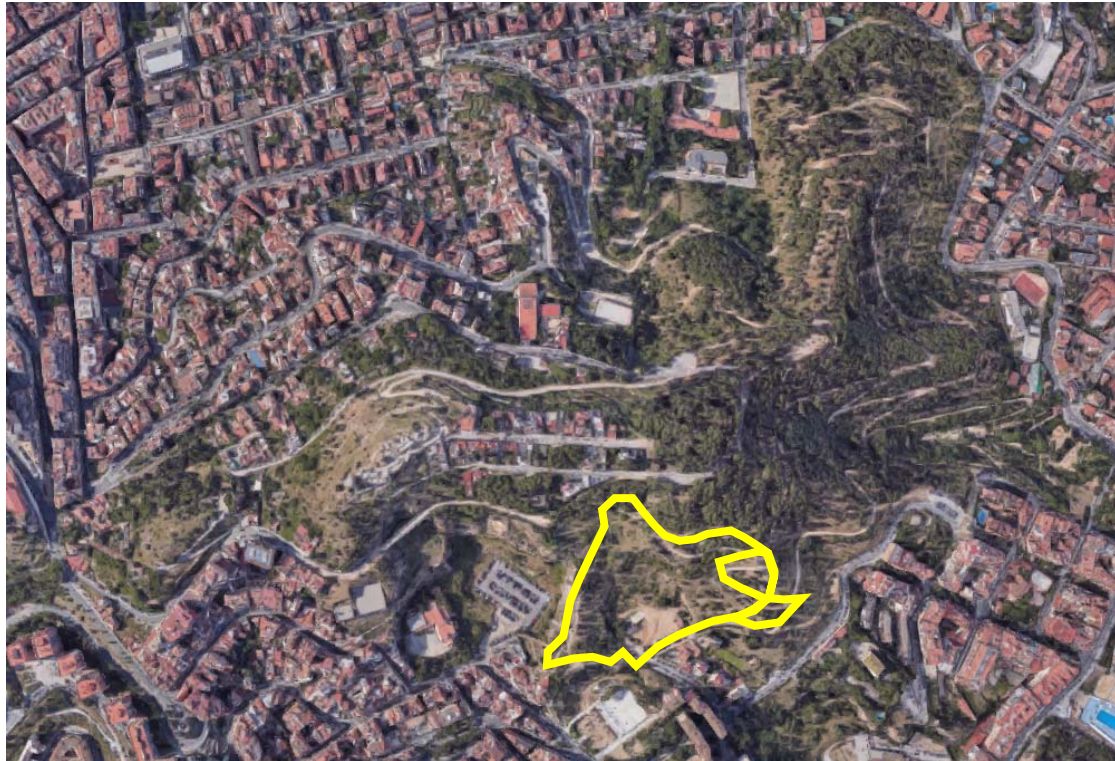

Retirada de 4 tones de fragments de fibrociment de camins i marges



2. Confinament de camins i talussos

Dates: Del 4 d'abril al 29 de setembre de 2018

Quantitat enretirada: 42'7 Tn de terres.

Tècnica de confinament:

- **Camins:** sauló estabilitzat, formigó i formigó armat. Retirada de terres amb mitjans manuals amb Pla de Treball aprovat per l'Autoritat Laboral.
- **Talussos:** malla i hidrosembra, i terra vegetal

Import dels treballs: 153.480 €



- Camins confinats amb sauló estabilitzat sòlid**
Amplada: 3'5m. Total: 1.487'65m²
- Camins confinats amb formigó.**
Amplada: 1'8m. Total: 407'40m²
- Camins confinats amb formigó armat (fort pendent).** Amplada: 3m. Total: 290'10m²
- Zones confinades amb malla i hidrosembra.**
Total: 1.000m²
- Zones confinades amb terra vegetal.**
Total: 1.000m²





2. Confinament de camins





2. Confinament de talussos






3. Inspecció i recollida de restes de fibrociment

Dates: 30 i 31 d'octubre de 2018

Quantitat enretirada: 80 kg de fragments de fibrociment

Tècnica: Recollida manual amb Pla de Treball aprovat per l'Autoritat Laboral

Import: 3.025 €

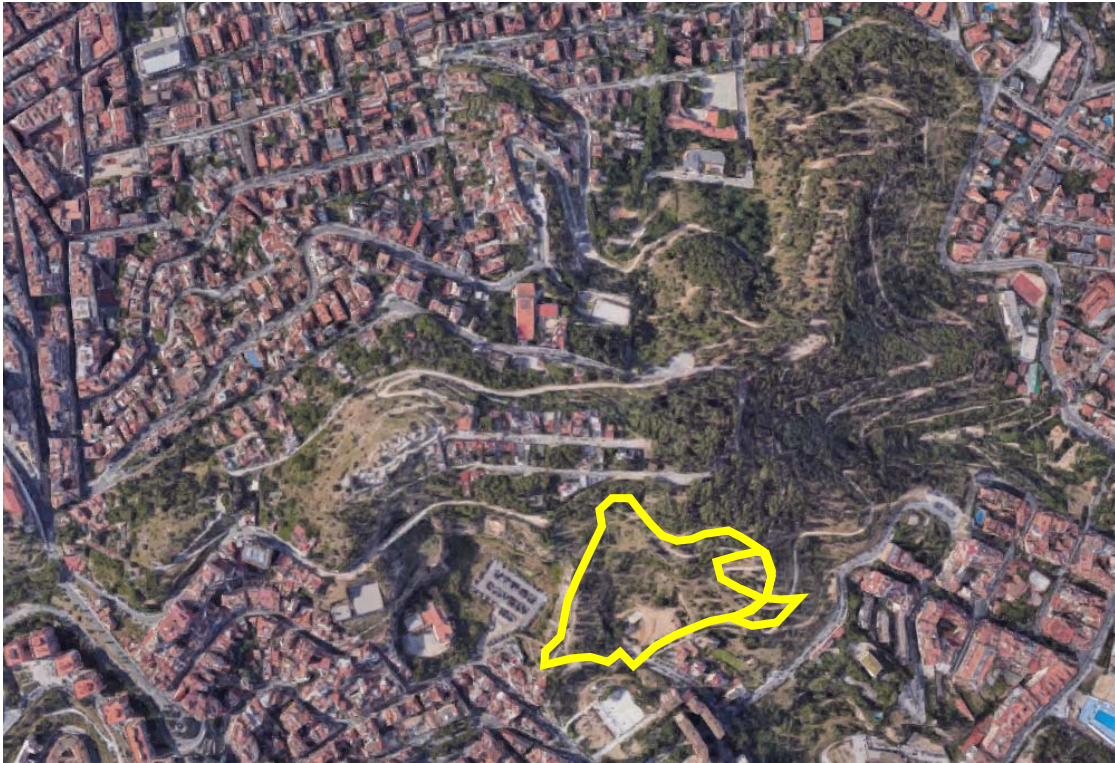



3. Inspecció i recollida de restes de fibrociment

Dates: 30 i 31 d'octubre de 2018

Quantitat enretirada: 80 kg de fragments de fibrociment

Tècnica: Recollida manual amb Pla de Treball aprovat per l'Autoritat Laboral

Import: 3.025 €



Inspecció i recollida de restes de fibrociment aflorats a conseqüència de pluges torrencials.



02

Actuacions futures

1. **Retirada de plaques i fragments de fibrociment**
2. **Confinament de talussos**
3. **Inspeccions visuals periòdiques i recollida de fragments detectats**



1. Retirada de placa de fibrociment

Data prevista: Juny 2019

Tècnica: Recollida manual amb Pla de Treball aprovat per l'Autoritat Laboral

Import estimat: 2.500 €



Retirada de 10 m2 d'una coberta de fibrociment abans que quedi oculta per la vegetació existent.






1. Retirada de fragments de fibrociment

Data prevista: Juny 2019

Tècnica: Recollida manual amb Pla de Treball aprovat per l'Autoritat Laboral

Import: 2.500 €

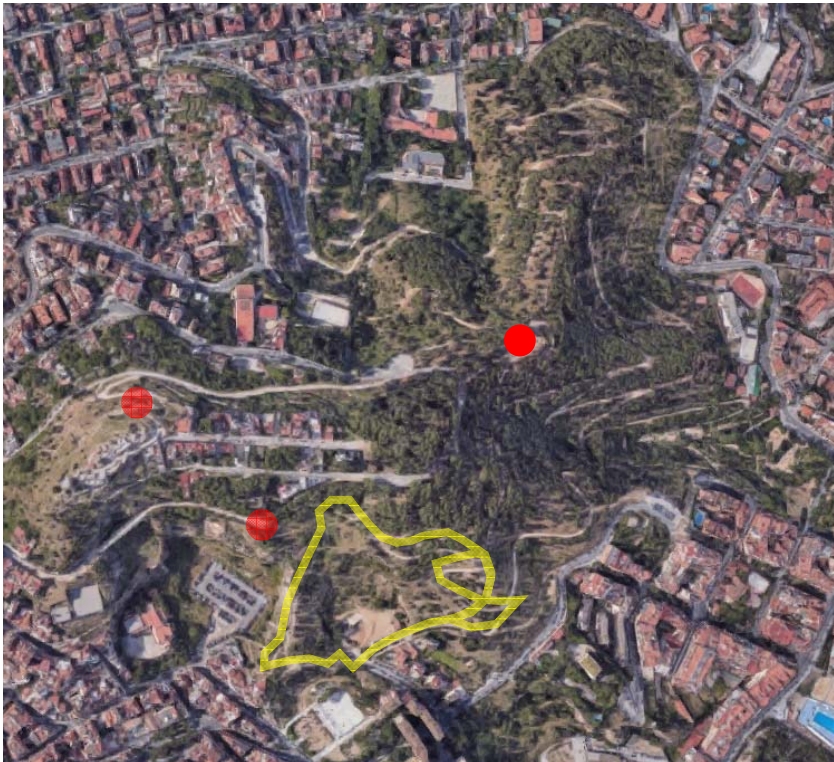

Aquesta zona comprèn una superfície d'uns 500 m². La característica principal és que la dispersió dels elements de fibrociment detectats es localitzen en talussos i marges dels camins.





2. Confinament d'un talús

Data prevista: Juny 2019

Tècnica: Recobriment del talús amb geomalla permanent

Import estimat: 8.500 €



Es planteja realitzar un encapsulament del talús, de 25 metres de llarg, 4 metres d'alçada i un pendent del 70%.



2. Confinament d'un talús

Data prevista: Juny 2019

Tècnica: Recobriment del talús amb geomalla permanent

Import estimat: 8.500 €



Es planteja el recobriment del talús amb una geomalla permanent amb matriu 100% fibra de coco i tres xarxes estables de polipropilè de 1,27x1,27cm de malla amb la capa central corrugada.



3. Inspeccions visuals periòdiques i recollida de fragments detectats

Data prevista: 2 inspeccions fixades + inspeccions d'urgència després d'episodis extraordinaris.





03

Normativa

Aplicació de l'Article 11 del Real Decret 396/2006 de l'Amiant, que permet activar el Pla de Treball de tràmit d'urgència, per la detecció d'elements de fibrociment imprevistos.

Gràcies per la vostra col·laboració!

www.bcn.cat



**Ajuntament
de Barcelona**
