

***ANNEX XIV***

***EXEMPLE PROTOCOLS ESPECIALS***

## PROCEDIMENT ESPECIAL PER A L'APROVACIÓ DELS PROJECTES, I EXECUCIÓ DE LES OBRES, DE CARRILS BICI, A LA CIUTAT DE BARCELONA, EMPARAT PEL PUNT I.9 DEL PROTOCOL D'INFRAESTRUCTURES<sup>1</sup>


SJC/gm

**Òrgan instructor: Gerència d'Ecologia Urbana (Medi Ambient)**

**Òrgan responsable: Operador Municipal (OM)**

### APROVACIÓ DEL PROJECTE BASE

Per raons de calendari, i per la particularitat pròpia del PCB, el projecte obtindrà una mena *d'Informe de Validació Tècnica* exprés que serà un equivalent a la ITP però sense que s'hagi demanat informes a tots els Responsables de l'Espai Públic. L'informe serà emès per la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures per al tràmit de l'aprovació inicial.

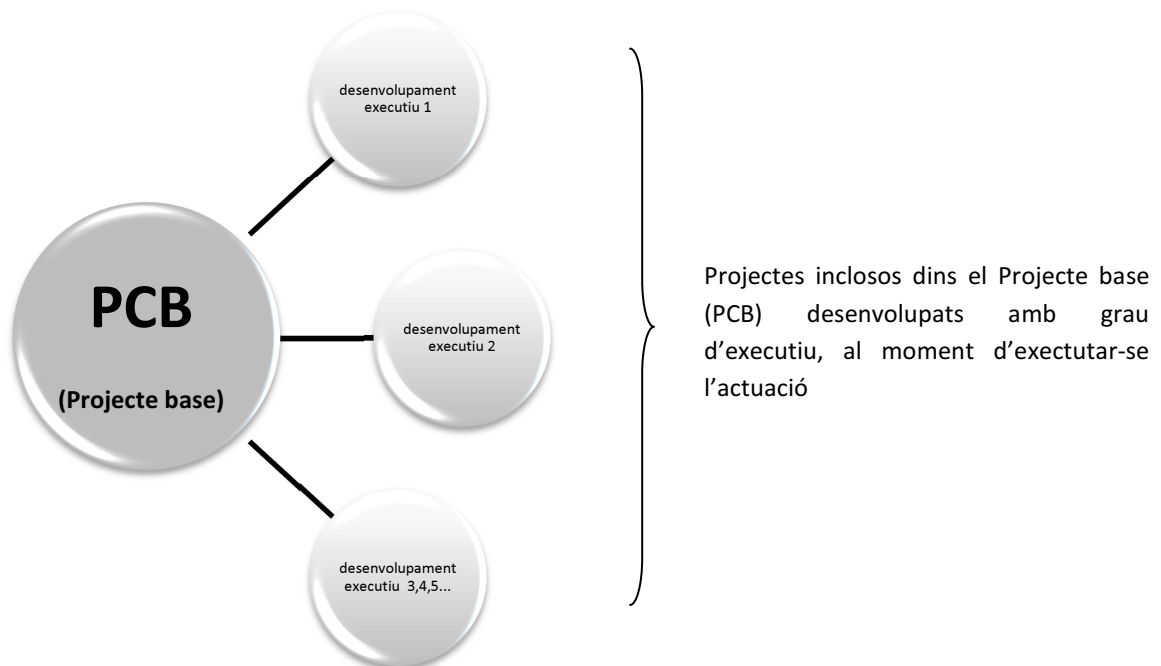

<sup>1</sup> Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructura i/o elements d'urbanització, conservació i millora, i projectes d'urbanització, signat en data 1 d'octubre de 2013


El Projecte base del PCB, recull les característiques bàsiques de l'actuació, però per a la seva aplicació requereix de la redacció dels desenvolupaments executius de cadascuna de les actuacions.

Aquests desenvolupaments executius que s'aniran redactant al llarg de la duració del PCB, NO requeriran d'una nova validació tècnica, atès que el projecte base ja en disposa, però els Responsables de l'Espai Públic (REPs) PODRAN, si ho desitjen, informar sobre els executius.

Els Responsables de l'Espai Públic que hi podran intervenir són: Comitè d'Obres, Projectes Urbans, Direcció de Mobilitat, Districte/s, Neteja, Pavimentació, BCASA, Enllumenat, i Parcs i Jardins.

Fases dels projectes executius de desenvolupament:


**Validació tècnica a nivell de desenvolupament executiu del projecte.-**

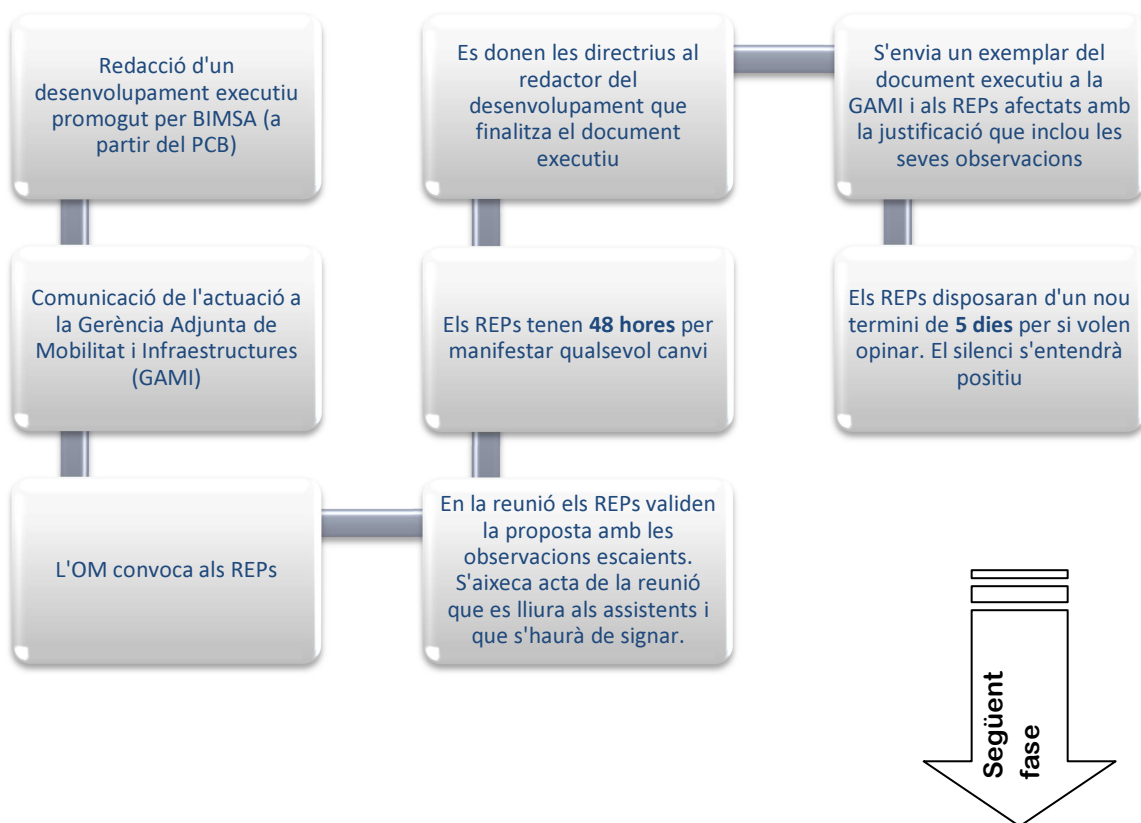

**Execució i recepció de les obres.-**



<sup>1</sup> Imprescindible informe parcial de recepció de/l's districte/s i de la Direcció de Serveis de Mobilitat



**L'espai entra formalment en  
funcionament**

---

**PROJECTES QUE NO FORMÈSSIN PART DEL PCB APROVAT**


El procediment reflectit al punt anterior afecta a totes aquelles actuacions que estiguessin contemplades en el Projecte constructiu base (PCB).

Per contra, aquelles altres actuacions que al moment de l'aprovació del projecte constructiu base (PCB) no estiguessin contemplades, hauran de seguir, per a la seva execució, les directrius assenyalades al protocol exprés que s'adjunta al present document (*Annex I*).

---

**PROJECTES MODIFICATS**

**Modificats.-** Les actuacions que estiguessin contemplades en el projecte base del PCB aprovat, i que al moment de desenvolupar-se executivament requerissin de modificacions no substancials respecte el que es va aprovar, es tramitaran com a modificats i implicarà:



\* Si un REPs no ha informat un desenvolupament executiu en la seva fase de validació tècnica, la validació del modificat tampoc se li passarà



Per tal que la Regidora – Quarta Tinent d'Alcalde pugui aprovar qualsevol modificat derivat del PCB, esdevé imprescindible haver concretat i delegat aquesta facultat en l'Acord d'aprovació definitiva del PCB. Tanmateix sembla recomanable l'encàrrec a BIMSA de la gestió de l'actuació:

*“APROVAR DEFINITIVAMENT (...) ENCARREGAR a la societat municipal BIMSA la gestió de l'actuació; i FACULTAR a la Regidora – Quarta Tinent d'Alcalde, per a l'adopció dels actes necessaris per al desenvolupament i execució del present Acord, entre els quals s'inclou la possibilitat d'aprovar la modificació del projecte aprovat i els seus projectes executius de desenvolupament, en el cas que així sigui pertinent, amb l'autorització de la despesa que això comporta, fins a un màxim del 20% de l'import total del projecte”.*

**Revisats.-** Quan l'actuació que estigués contemplada en el projecte base del PCB aprovat, requerís per al seu desenvolupament executiu de canvis substancials, el document seguirà el següent procediment:



\* La revisió d'un desenvolupament executiu tampoc se li passarà al REPs que no hagués informat el projecte executiu inicial

 Sr. Manuel Valdés López Gerent Adjunt de Mobilitat i Infraestructures	 Sr. Jordi Campillo Gámez Gerent d'Ecologia Urbana
---	---

Barcelona, a 5 de maig de 2016

